Bauzeitplan BV Daxinger Mondseeberg

Vorgangsname	Dauer [Tag]	F-Beginn [Tag]	F-Ende [Tag]	Firma
BAUZEITPLAN WH DAXINGER THOMAS				
Planungs u. Vorleistungen	88	10.09.2018	16.11.2018	
Erstellen SiGe Planung	10	10.09.2018	21.09.2018	DeLacher Bau
Bau KG	48	10.09.2018	16.11.2018	DeLacher Bau
Statik u. Polierplanung	10	10.09.2018	21.09.2018	
Abklären Oberflächenwasserentsorgung	43	10.09.2018	09.11.2018	AG
Vermessungspunkte Nachbargebäude	15	01.10.2018	25.10.2018	LEG, ZT
Bewässerung Nachbargebäude	10	17.09.2018	28.09.2018	Arch. Schobeberger
Bewässerung Straßenal	10	17.09.2018	28.09.2018	Buchschachner
Einmessen Gebäude Geometer	2	18.10.2018	19.10.2018	LEG, ZT
Erdarbeiten	159	01.10.2018	08.03.2019	
Humus abziehen / Deponie verbesserbar	1	01.10.2018	01.10.2018	
Aushub Baugrube	18	02.10.2018	25.10.2018	
Aushub Rieterlandesbrücken u. Liftschacht	8	22.10.2018	02.11.2018	
Kanal u. Leitungen unter Bodenplatte	8	22.10.2018	02.11.2018	
Schottertrag Kiesplatz	8	10.10.2018	19.10.2018	
Hinterfüllen Baugrube	20	12.11.2018	20.12.2018	
Grünanlietung verlegen	5	10.12.2018	14.12.2018	
Wiederfüllung verlegen	5	10.12.2018	14.12.2018	
Oberflächenwasserkanal verlegen	19	26.11.2018	20.12.2018	
Schmutzwasserkanalanschluss herstellen	5	26.11.2018	30.11.2018	
Straßenquerungen graben	2	20.11.2018	07.12.2018	
Oberflächenwasserleitung zu Löschteich g	10	12.11.2018	29.11.2018	
Drainschlichtungen	45	07.01.2019	08.03.2019	
Rauminstarbeiten	152	08.10.2018	08.03.2019	EBNERBAU
Baustelle einrichten	2	08.10.2018	09.10.2018	
Einmessen Baugrube u. Schnurbäume	2	18.10.2018	19.10.2018	
Bewehren Hangsicherung	14	08.10.2018	25.10.2018	
Einlegen Verohrungen unter Bodenplatte	4	22.10.2018	25.10.2018	
Liftgrube u. Rieterlandesbecken herstellen	4	22.10.2018	25.10.2018	
Herstellen Bodenplatte	3	29.10.2018	31.10.2018	
Wände KG Stahlbeton	5	05.11.2018	09.11.2018	
Treppe EG-KG Stahlbeton	1	09.11.2018	09.11.2018	
Decke u. KG herstellen	5	12.11.2018	16.11.2018	
Wände EG Stahlbeton	4	19.11.2018	22.11.2018	
Wände EG Ziegel	3	22.11.2018	26.11.2018	
Treppe EG-DG Stahlbeton	1	26.11.2018	26.11.2018	
Decke u. EG herstellen	5	26.11.2018	30.11.2018	
Balkonplatte DG Stahlbeton	3	29.11.2018	03.12.2018	
Liftschacht u. Treppenhaus DG	3	03.12.2018	05.12.2018	
Kamin versetzen	2	13.12.2018	14.12.2018	Ahrens
Ausgleich für Holzbauwände DG	1	30.11.2018	30.11.2018	
Decke Treppenhaus u. Liftschacht	2	06.12.2018	07.12.2018	
Drücznauern Stahlbeton	45	07.01.2019	08.03.2019	
Kanal u. Anschlussleitungen verlegen	19	26.11.2018	20.12.2018	
Oberflächenwasserleitung herstellen	10	12.11.2018	29.11.2018	
Spachtelt Fensterleibungen	4	17.12.2018	20.12.2018	
Zwischenwände u. Vorinstaurungen	15	07.01.2019	25.01.2019	
Stahlstürgen u. Brandschutztüren versetz.	10	21.01.2019	01.02.2019	
Steinmen Leitungen	15	07.01.2019	25.01.2019	
Verputzen Technikraum Ziegelwand	2	04.02.2019	05.02.2019	
Estrich Technikraum	2	06.02.2019	07.02.2019	
Baugrubsicherung	17	08.10.2018	24.10.2018	Bernegger
Baustelle einrichten	1	08.10.2018	08.10.2018	
Baumeisterarbeiten	16	09.10.2018	24.10.2018	
Holzbauarbeiten	229	22.10.2018	07.08.2019	EBNER BAU
Bauteilen KG montieren	2	03.12.2018	04.12.2018	
Abbund Wände BBS	30	22.10.2018	04.12.2018	
Abbund Dachstuhl	12	19.11.2018	04.12.2018	
Montage DG Wände BBS	4	05.12.2018	10.12.2018	
Montage Dachstuhl	4	11.12.2018	14.12.2018	
Dachschalungen u. Lattungen	4	17.12.2018	20.12.2018	
Zwischenwände DG herstellen	8	07.01.2019	16.01.2019	
Innenausbau Dachstuhl	8	17.01.2019	28.01.2019	
Ausbauarbeiten DG Wände	6	24.01.2019	31.01.2019	
Zellulosedämmung DG Dach	1	01.02.2019	01.02.2019	
Wasgnichte Untersicht montieren	5	04.02.2019	08.02.2019	
Holzfaserdämmung Wände DG	5	11.02.2019	15.02.2019	
Holzfassade DG	15	18.02.2019	08.03.2019	
Terrassenbelage EG u. OG	19	13.05.2019	31.05.2019	
Lattenwände Keller	2	03.06.2019	04.06.2019	
Balkontrennwand	3	05.06.2019	07.06.2019	
Gerüstarbeiten	134	03.12.2018	05.04.2019	
Schutzgerüst Dachstuhl	35	03.12.2018	18.01.2019	EBNER BAU
Fassadengerüst Putz u. Holzfassade herst	35	18.02.2019	05.04.2019	
Dachdecker u. Spengler	96	03.12.2018	08.03.2019	
Spengler u. Dachdeckung HD	10	07.01.2019	18.01.2019	
Abdichten Bodenplatte KG	2	03.12.2018	04.12.2018	
Abdichten Sockel Holzbau DG	2	06.02.2019	08.02.2019	
Dampfsperre Terrasse EG	1	04.02.2019	04.02.2019	
Dampfsperre Terrasse DG	1	04.02.2019	04.02.2019	
Abdichtung Terrasse EG	5	26.02.2019	01.03.2019	
Abdichtung Terrasse OG	7	28.02.2019	08.03.2019	
Dachersatzmatte verlegen	2	01.03.2019	08.03.2019	
Bauelemente	152	21.01.2019	21.06.2019	
Montage Fenster u. Balkontüren	7	21.01.2019	29.01.2019	
Montage Sonnenschutz	5	19.04.2019	19.04.2019	
Eibelstock Haustüre	3	30.01.2019	01.02.2019	
Montage Haustüre	2	11.03.2019	12.03.2019	
Montage Garagentor	2	13.03.2019	14.03.2019	
Innentüren montieren	4	17.06.2019	21.06.2019	
Haustechnik HKLS	250	24.09.2018	31.05.2019	
Planung HKLS	5	24.09.2018	28.09.2018	
Anbindeleitung WP unter Bodenplatte	1	25.10.2018	25.10.2018	
Rohbauinstallation TOP 1u. 2	30	28.01.2019	22.03.2019	
Rohbauinstallation TOP 3	20	11.02.2019	22.03.2019	
Montage WP im Technikraum	5	18.02.2019	22.02.2019	
Verlegen FBH	7	28.03.2019	05.04.2019	
Aushetzen Estrich	20	11.04.2019	10.05.2019	
Feinmontage TOP 3	10	06.05.2019	17.05.2019	
Feinmontage TOP 1 u. 2	14	13.05.2019	31.05.2019	
Elektroinstallation	299	24.09.2018	19.07.2019	
Planung Elektroinstallation	5	24.09.2018	28.09.2018	
Baustromverteiler	2	04.10.2018	05.10.2018	
Verlegen Anbindeleitungen	5	10.12.2018	14.12.2018	
Rohbauinstallation TOP 1 u. 2	30	28.01.2019	22.03.2019	
Rohbauinstallation TOP 3	20	11.02.2019	22.03.2019	
Anschluss WP Technikraum	2	21.02.2019	22.02.2019	
Feinmontage TOP 3	10	06.05.2019	17.05.2019	
Feinmontage TOP 1 u. 2	14	13.05.2019	31.05.2019	
Blitzschutzanlage	2	18.07.2019	19.07.2019	
Innenputzarbeiten	61	04.02.2019	05.04.2019	
Innenputz herstellen KG, EG, OG	5	04.03.2019	08.03.2019	
Wärmedämmverbundsystem				
WDVS MW Kellerwand herstellen	3	18.03.2019	20.03.2019	
WDVS herstellen Außenwände	13	20.03.2019	05.04.2019	
Trockenbauarbeiten				
Trockenbauwände DG herstellen	3	04.02.2019	06.02.2019	
Vorsatzschalen EG herstellen	4	07.02.2019	12.02.2019	
Beplankung AW DG herstellen	3	13.02.2019	15.02.2019	
Beplankung Dach Unterseiht OG herstelle	5	18.02.2019	22.02.2019	
Schachtwände EBO herstellen	3	26.02.2019	27.02.2019	
Estricharbeiten	51	26.03.2019	14.05.2019	
Beschichten OG, EG, KG	3	26.03.2019	27.03.2019	
Estrich betonieren	3	08.04.2019	10.04.2019	
Estrich Bauteuchte messen	1	14.05.2019	14.05.2019	
Schlosserarbeiten	235	23.11.2018	05.07.2019	
Stahlsäulen liefern	1	23.11.2018	23.11.2018	
Balkongeländer UK montieren	5	18.02.2019	22.02.2019	
Balkongeländer Glas montieren	5	06.05.2019	10.05.2019	
Stiegengeländer montieren	4	27.05.2019	31.05.2019	
Auflaengeländer u. Mülltonnen montieren	5	01.07.2019	05.07.2019	
Liftbauer	88	23.04.2019	19.07.2019	
Lift montieren	4	23.04.2019	26.04.2019	
Abnahmefahrtnahme Lift	1	19.07.2019	19.07.2019	
Fliesenlegerarbeiten	103	11.02.2019	24.05.2019	
Fliesen KG Technikraum	2	11.02.2019	12.02.2019	
Wandfliesen DG	3	06.05.2019	08.05.2019	
Wandfliesen EG	2	09.05.2019	10.05.2019	
Bodenfliesen DG	3	13.05.2019	15.05.2019	
Bodenfliesen EG	4	16.05.2019	21.05.2019	
Bodenfliesen KG	3	22.05.2019	24.05.2019	
Malerarbeiten	149	15.02.2019	12.07.2019	
Wände Technikraum	1	15.02.2019	15.02.2019	
Wände u. Decken streichen Top 3	3	23.04.2019	26.04.2019	
Wände u. Decken streichen TOP 1 u. 2	5	26.04.2019	03.05.2019	
Wände u. Decken streichen KG	5	08.05.2019	10.05.2019	
Ausbessern von Übergäbe	2	11.07.2019	12.07.2019	
Bodenbeläge	47	27.05.2019	12.07.2019	
Fertigparkett TOP 3	8	27.05.2019	06.06.2019	
Fertigparkett TOP 1 u. 2	8	06.06.2019	14.06.2019	
Asphaltbelag Keller	3	17.06.2019	19.06.2019	
Außenanlagen herstellen				
Terrasse Eichenplatten OG	4	11.06.2019	14.06.2019	
Rohplanum herstellen	2	13.06.2019	17.06.2019	
Randsteine u. Einfahrschächte	4	19.06.2019	26.06.2019	
Asphaltbeläge	3	26.06.2019	28.06.2019	
Maschendrahtzaun montieren	5	01.07.2019	05.07.2019	
Gartenarbeiten / Rasen anlegen	5	08.07.2019	12.07.2019	
Sonstige Arbeiten				
Briefkasten montieren	5	01.07.2019	05.07.2019	
Beschilderungen	5	01.07.2019	05.07.2019	
Feuerlöscher	5	01.07.2019	05.07.2019	

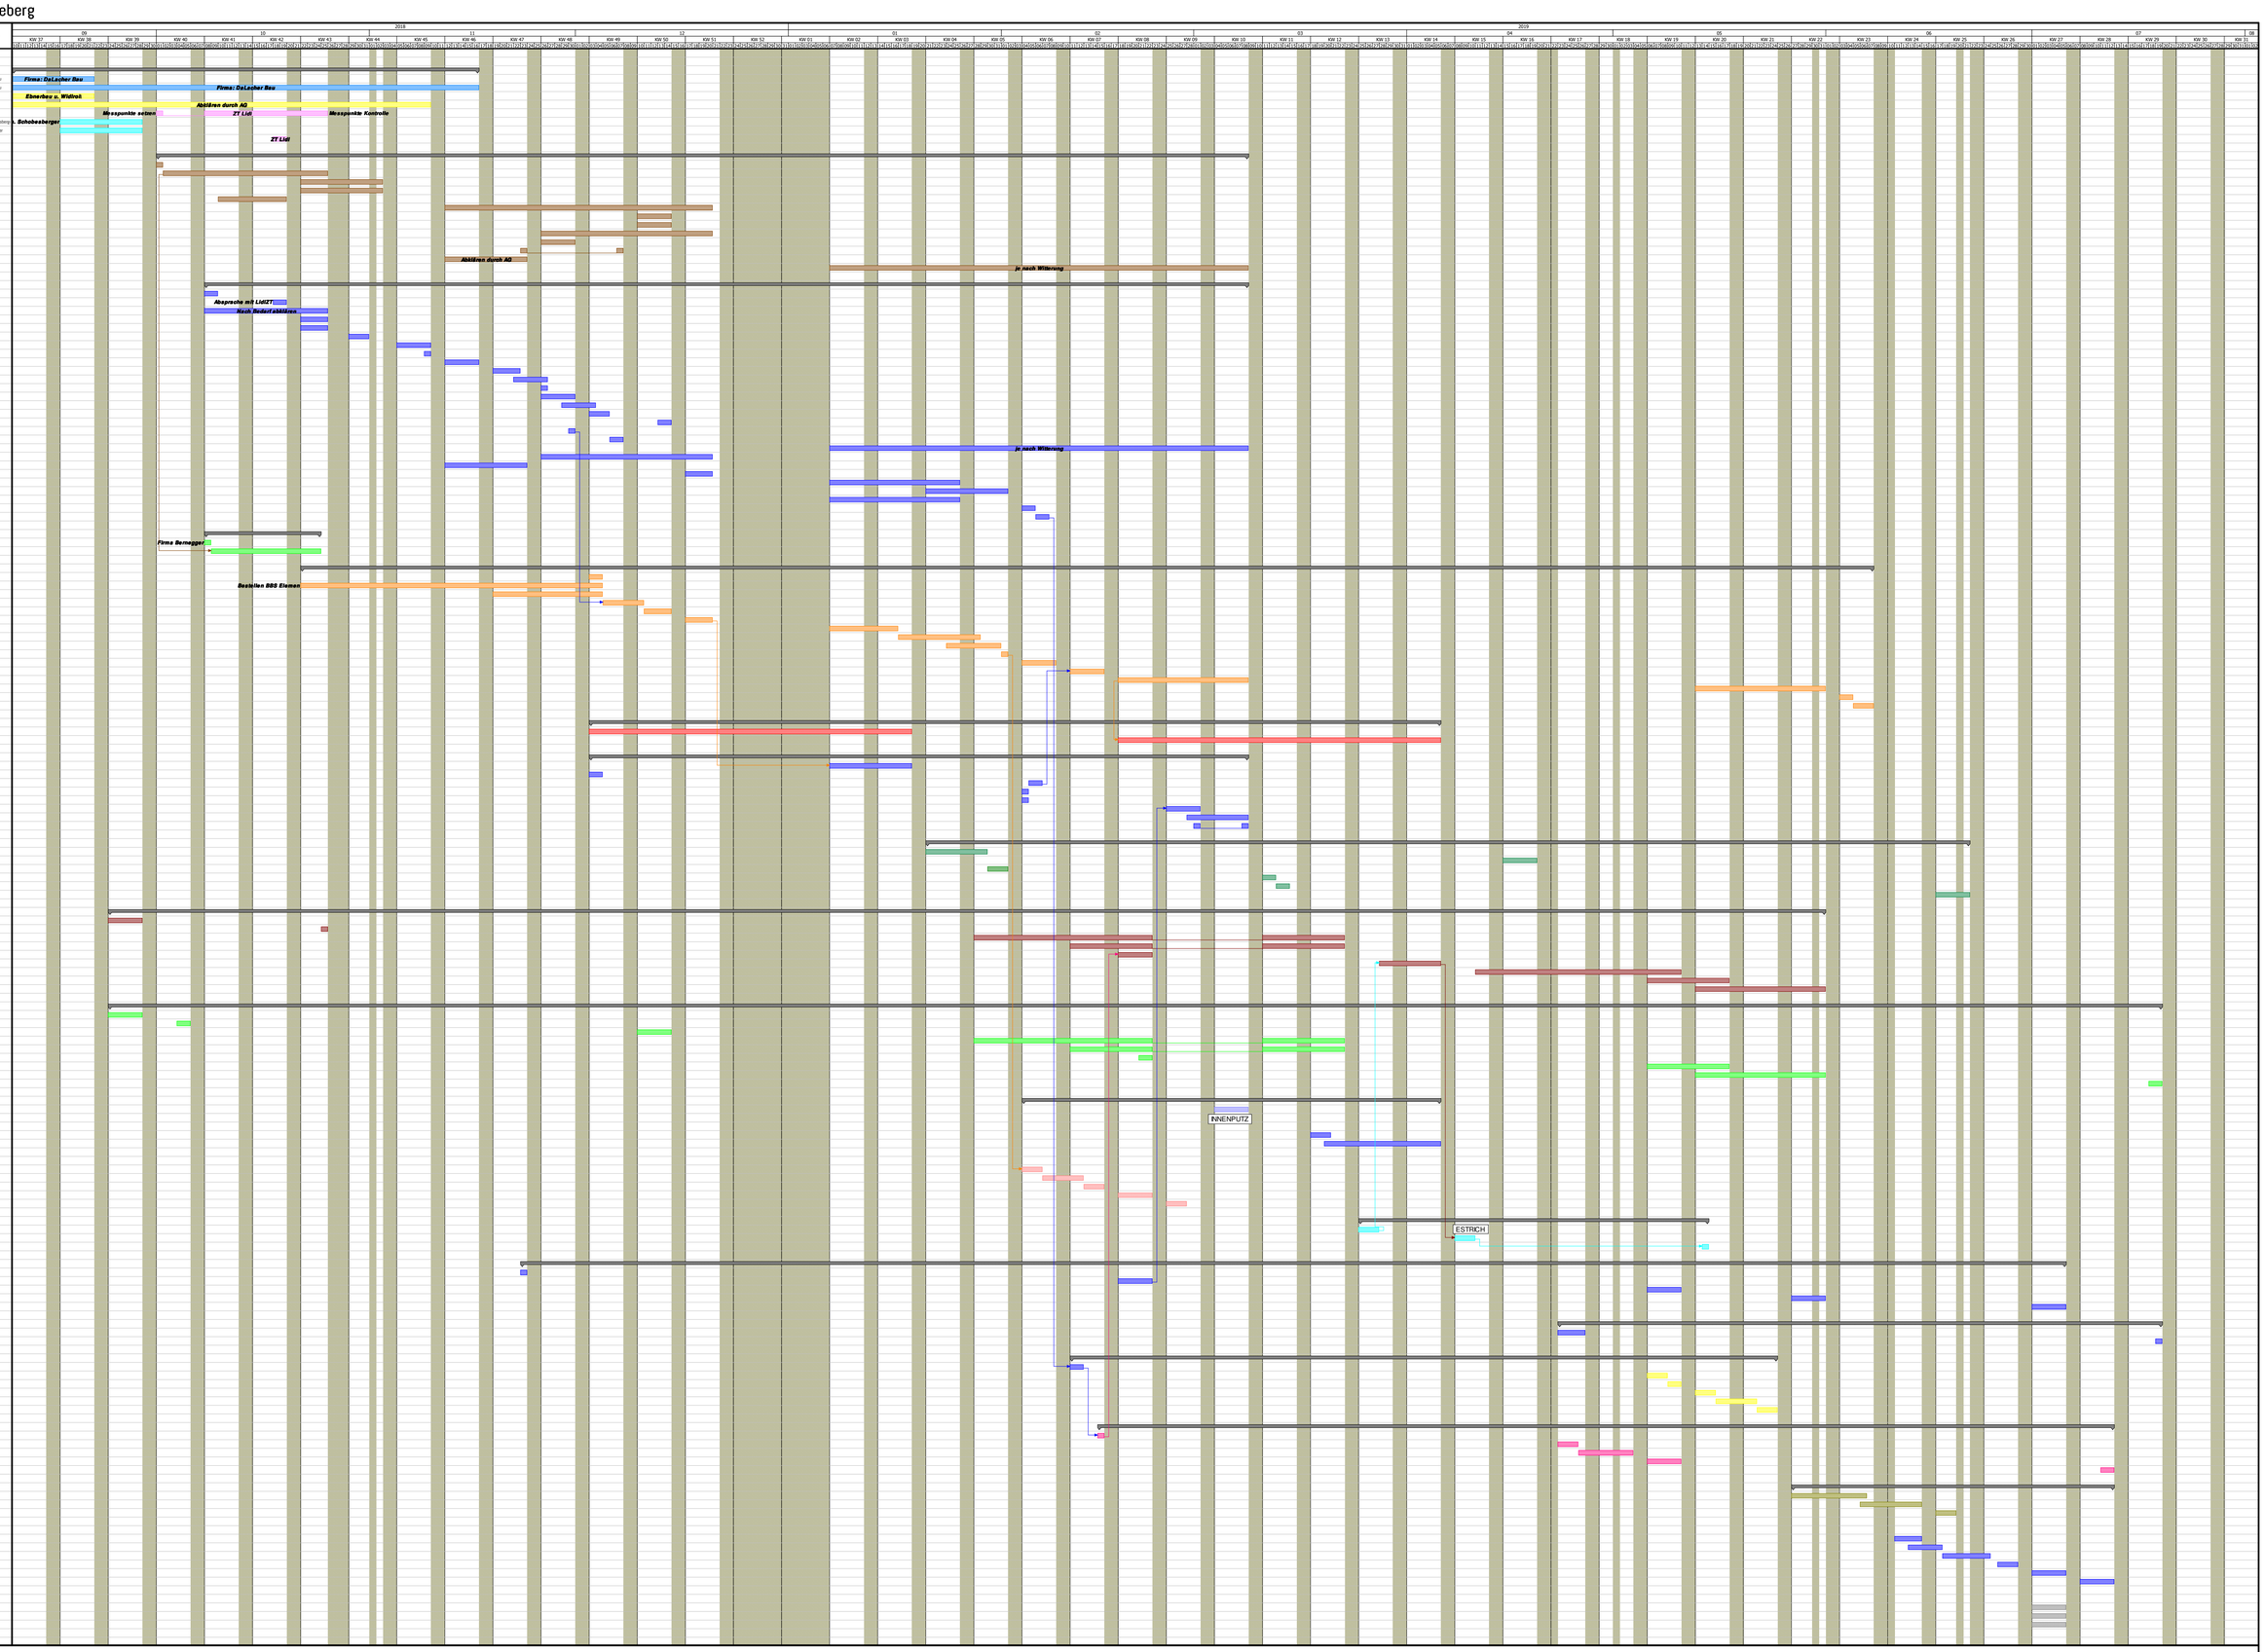

Projekt : WH Daxinger Thomas

Plannummer: 03 Plandatum: 17.09.2018

Vorgang | Fortschritt | Sammelvorgang | Meilenstein | Unterbrechung
